561 Mattli Antoniushaus - Fassadensanierung Bettentrakt, Erneuerung Gästezimmer **Bauphasenplan Grobeinteilung** **sat / SPARCS Architekten - 18.12.2019**
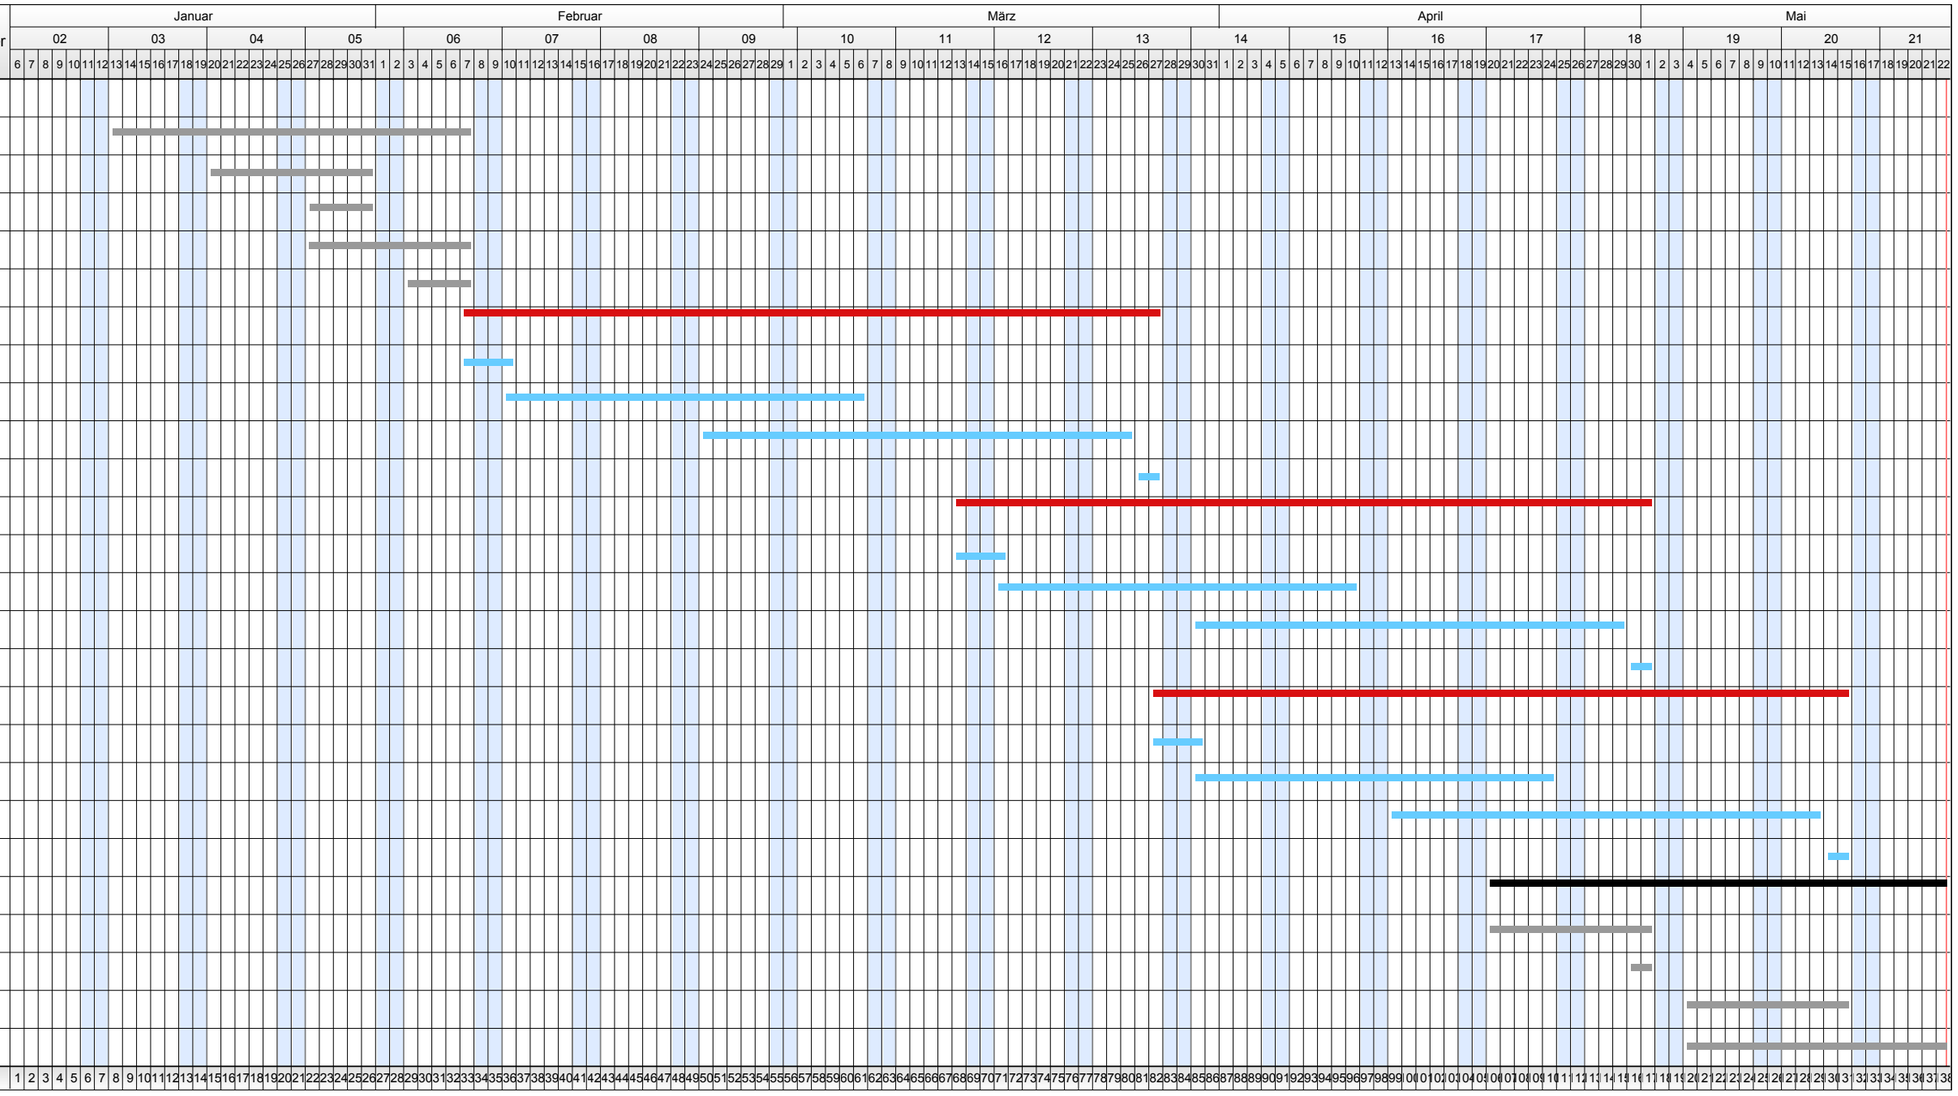
Aktivitätsname	Start	Ende	Dauer
Vorbereitung			
Vorarbeiten WärmeverteilungUG und EG	13.01.	07.02.	20
Gerüst	20.01.	31.01.	10
Kran, Baustelleninstallation	27.01.	31.01.	5
Spezialabbrüche und Sondagen Trakt 3, 3 OG	27.01.	07.02.	10
Hochdruckreinigung Fassade allel Trakte	03.02.	07.02.	5
Etappe 1	**07.02.**	**27.03.**	**36**
Räumen, Absperren, Stromlos	07.02.	10.02.	2
Abbrüche, Fassadenabbruch, Fassadenbau	10.02.	06.03.	20
Installation/Ausbau	24.02.	25.03.	23
Reinigung, Übergabe,, Möblierung	26.03.	27.03.	2
Etappe 2	**13.03.**	**01.05.**	**36**
Räumen, Absperren, Möblierung	13.03.	16.03.	2
Abbrüche, Fassadenabbruch, Fassadenbau	16.03.	10.04.	20
Installation/Ausbau	30.03.	29.04.	23
Reinigung, Übergabe,, Möblierung	30.04.	01.05.	2
Etappe 3	**27.03.**	**15.05.**	**36**
Räumen, Absperren, Stromlos	27.03.	30.03.	2
Abbrüche, Fassadenabbruch, Fassadenbau	30.03.	24.04.	20
Installation/Ausbau	13.04.	13.05.	23
Reinigung, Übergabe,, Möblierung	14.05.	15.05.	2
Folgearbeiten	**20.04.**	**22.05.**	**25**
Rükbau Gerüst	20.04.	01.05.	10
Abbau Kran	30.04.	01.05.	2
Wiederherstellen Umgebung	04.05.	15.05.	10
Restanzen (Etagenoffice, Personalraum etc...)	04.05.	22.05.	15
